

## 附件 6.3 现场勘查记录

### 项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

#### 一、任命

现任命 李毅雄 同志，担任 元谋亚鑫包装有限责任公司安全设施验收评价报告 项目组长。

#### 二、授权范围


- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2024 年 07 月 25 日


#### 4 周边环境:

本项目位于元谋县工业聚集区小雷宰工业园区内，项目周边配套建设了给水、排水工程，10kV 线路达厂区边界。项目南面为已建成的“汇宇新材料（元谋）有限公司”，北面为正在建设的“华化新材料公司”，西面为地势稍低的荒坡地，东面为园区公用沥青路面机动车道。项目南、北面已用 2.2m 高实体围墙相隔，并保持相关规范规定的安全距离，东、西面在项目建设时用 $>1.7\text{m}$  铁栅栏隔离，厂区四周设置 $>6\text{m}$  缓冲地带，并设置 $>4\text{m}$  环形消防车道，使整个项目地形成完成，独立空间。本项目建设地点 1km 范围内，无自然保护区、名胜古迹、军事禁区等。

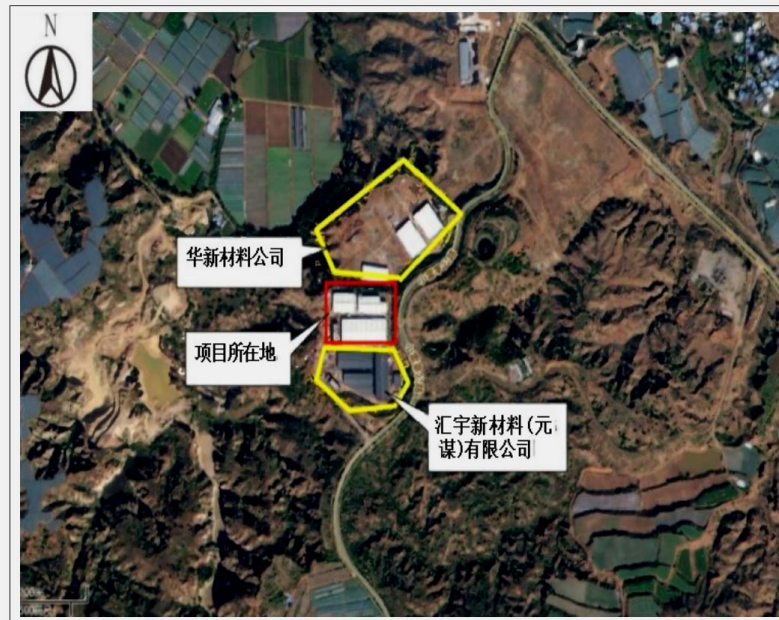

5. 生产区域平面布置情况：从西南侧入口向东侧依次展开，之间合理布置有序连接，第一部分为厂区入口、绿化区、办公楼（内含员工

食堂、职工宿舍)、消防水池及消防泵房、遗留施工板房。第二部分为生产区及库房、辅房,主要包括2号车间(原材料及成品库房)、3号车间(含锅炉房、机修房、预留备用房)、1号车间(含生产车间、发泡车间)。按照生产工艺流程和原料走向进行设计,在生产车间分隔原辅料暂存间。总配电室设在厂区东北角,其他辅助设施、设备附设在生产车间内。各独立建筑之间按相关规范设置环形消防车道并预留防火间距,消防车道转弯半径符合规范要求。

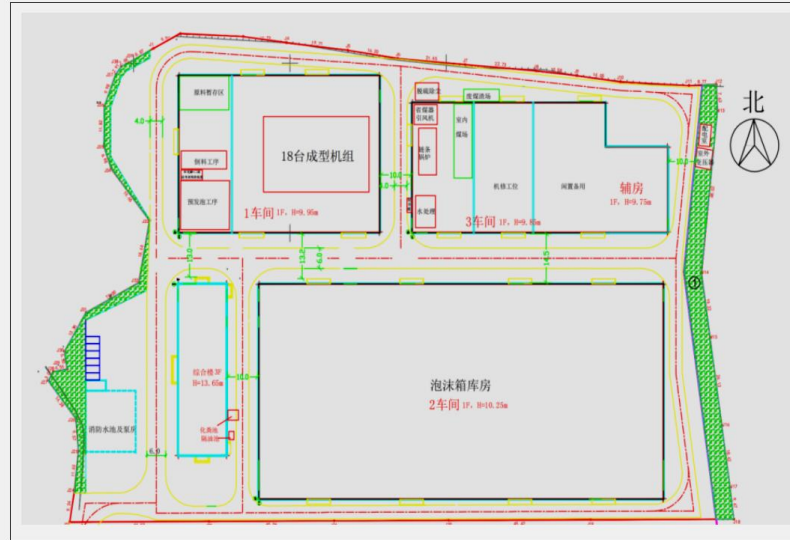

# 昭通市鼎安科技有限公司

## 安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：元谋亚鑫包装有限责任公司

项目类型：安全设施验收评价

法定代表人（负责人）：杨永杰

联系电话：18669118077

日期：2024.07.25


### 现场发现的问题及建议：

1. 配电室通往室外的孔洞未进行封堵，配电柜前未设置绝缘垫，门口未设置挡鼠板。
2. 柴油发电机房储存箱未接地，柴油发电机未有效接地，未设置通气管并引出室外，灭火器配备不足。柴油发电机排气管室外出口未设置防雨帽。
3. 消防控制室无人员值守，现场检查时系统正在报警，但无人员处置，现场未见报警处置记录，企业持证人员仅一人。
4. 消火栓、灭火器未落实定期巡检制度，现场未见巡检卡。
5. 紧急疏散逃生指示标识损坏，消火栓被杂物遮挡。
6. 锅炉房自动卸灰机链轮防护罩缺失。
7. 变压器隔离措施管控不到位，未设置安全警示标志，人员可在隔离栏两侧随意穿行。
8. 检修作业区可燃易燃材料（涂料、油漆、油脂等）未分隔储存。
9. 储气罐安全阀、压力表未定期检验。



### 安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: \_\_\_\_\_ 项目完成时间 \_\_\_\_\_ 年 月 日

机构名称	昭通市鼎安科技有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	元谋亚鑫包装有限责任公司安全设施验收评价报告	所在地区	元谋县黄瓜园镇	
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/>	现状评价 <input type="checkbox"/>	其他安全评价 <input type="checkbox"/>	
项目审批机关	元谋县	职工人数	50 人	
		销售额		
是否属跨省建设项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	资产总额	万	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
所属业务类别 (代码)				
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
李毅雄	0800000000205742		项目负责人、报告编制、现场勘查	
李晓达	0800000000205717		项目成员、报告编制、现场勘查	
崔巍	0800000000304343		项目成员	
陈恭文	1500000000300447		项目成员	
毛卫旭	0800000000205718		项目成员	
评价人员是否到现场勘查		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项		9	提出隐患治理建议措施多少项	9
被评价单位意见和建议				

注: 1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。  
 2. 要填写工整, 内容完整, 及时归档。
